Case No.

1405

Large Exhibits

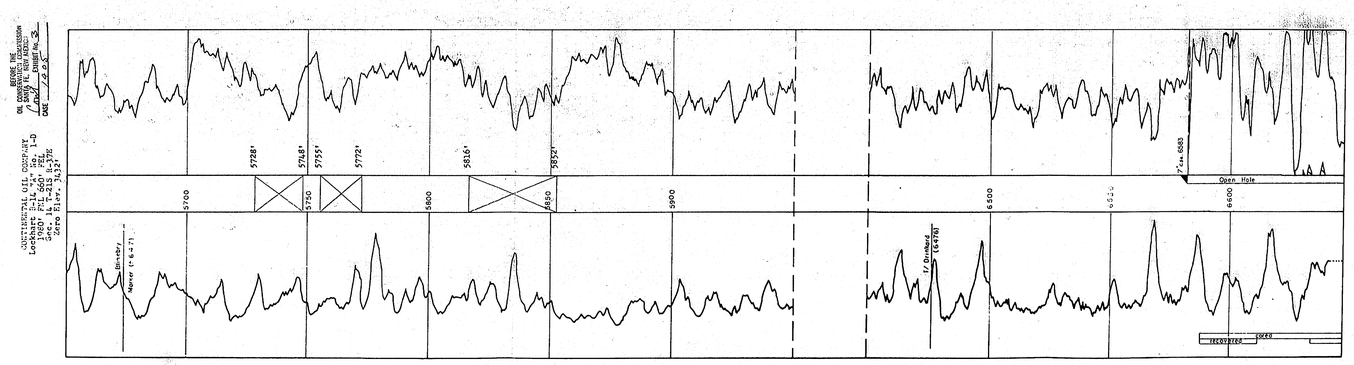

Set 13 3/8" csg. @ 230' w/250 sx (circ.) using 2 centralizers.
Set 9 5/8" csg. @ 3149' w/1400 sx LG Gel, 100 neat, 70 Sentas-Crete
Cement top 2500'; using 6 centralizers, 16 scratchers.

DST #1, 4650-5700; open 1 hr. Gas in 3 min. est. 413 MCF. SIP: 2250#
DST #2, 5100-5390; open 1 hr. Gas in 4 min. est. 413 MCF. SIP: 2250#
mus-cut mud. FP: 0# SIP: 750#

Set 7" csg. @ 6583' w/500 sx LG Gel, 100 neat, 25 Perlite (cement to
3200'); using 6 centralizers, 2 cement baskets, 2 scratchers. Drilled
TD 6640', scabbed 5 BPM for 4 hours. Acidized with 500 gal. 15%.

Completed for IP of 156 BOPD, no water, based on 12-hour test of
GOR 84, Flowing thru 24/64 choke on 24" cushion with 129.4 MCF Gas.
Gravity 44.2 Corr. Pressure 1,000#. FTP: 0-1000#.

Pay: Drinkard from 6538' to 6640'. Completed: 12-5-52. Tested: 12-8-

Tops: Abo 4,180', Top Salt 1,450, Base Salt 2540, Glorieta 5245,
Blinebry 5,680', Tubb 6164, Drinkard 6538.
