TIME	CUM. HRS./MIN.		PSIG @ 10,200 FEET	
9:45 AM	00 HRS.	00 MIN.	1809	GAUGE REACHED 10,200'
10:30 AM	00	45	1809	OPEN CHOKE, BEGIN 1ST RATE
	01	00	1684	
	01	15	1621	
	01	30	1592	
11:30 AM	01	45	1569	END RATE 1, BEGIN RATE 2
	02	00	1404	
	02	15	1319	
	02	30	1283	
12:30 PM	02	45	1278	END RATE 2, BEGIN RATE 3
	03	00	1155	
	03	15	1128	
	03	30	1137	
1:30 PM	03	45	1153	END RATE 3, BEGIN RATE 4
	04	00	1063	
	04	15	1076	
	04	30	1087	
2:30 PM	04	45	1099	END RATE 4, WELL SHUT-IN

TEST DATE:	AUGUST 11, 1973
TEST DEPTH:	10,200 FEET
ELEMENT NO.:	14659-N
RANGE:	0-3700 PSI
CLOCK NO.:	11782
RANGE:	0-24 HOUR

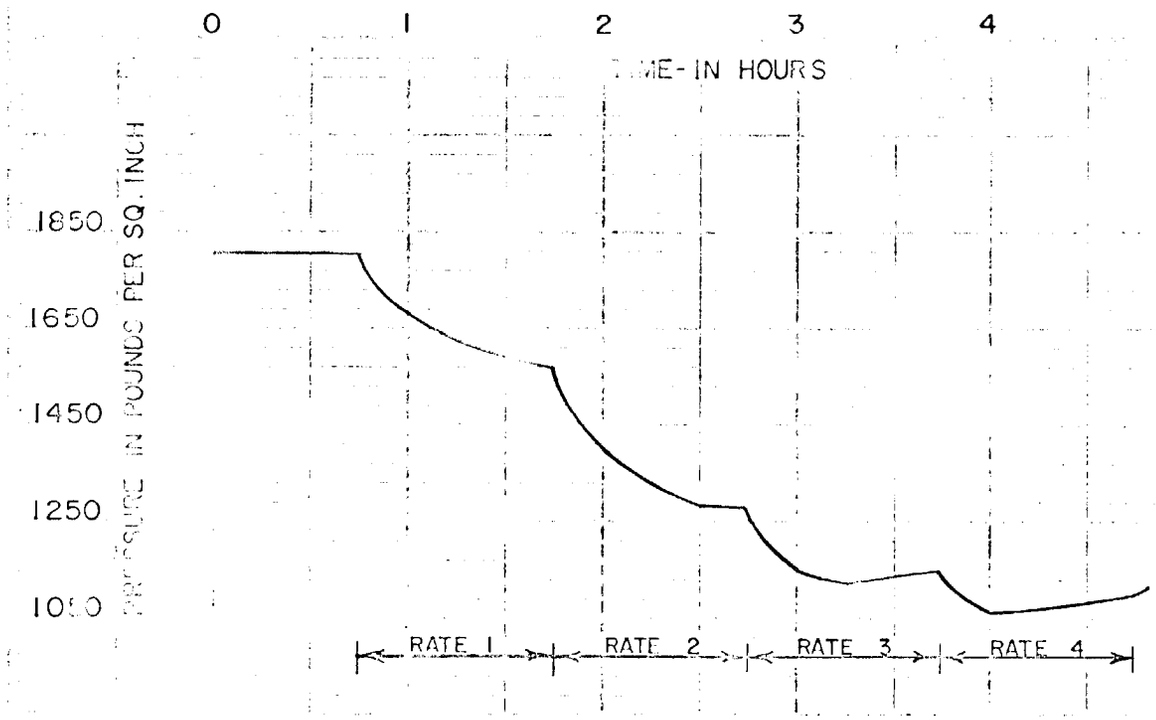

ADOBE OIL COMP

SMITH FEDERAL NO.

BOTTOM HOLE PRESSURES TO US

MULTI-POINT BACK PRESSURE T

8-15-73 M.C.T.
