660' FNL, 1980' FWL, Sec. 24, T20S, R26E, Eddy Co., NM
McMillan Morrow Gas

Spud date: 10/16/2002
Completion Date: 12/28/2002
Wolfcamp Recompletion: 04/07/2015

OXY USA INC.
McMillan 24 State #003
30-015-32337

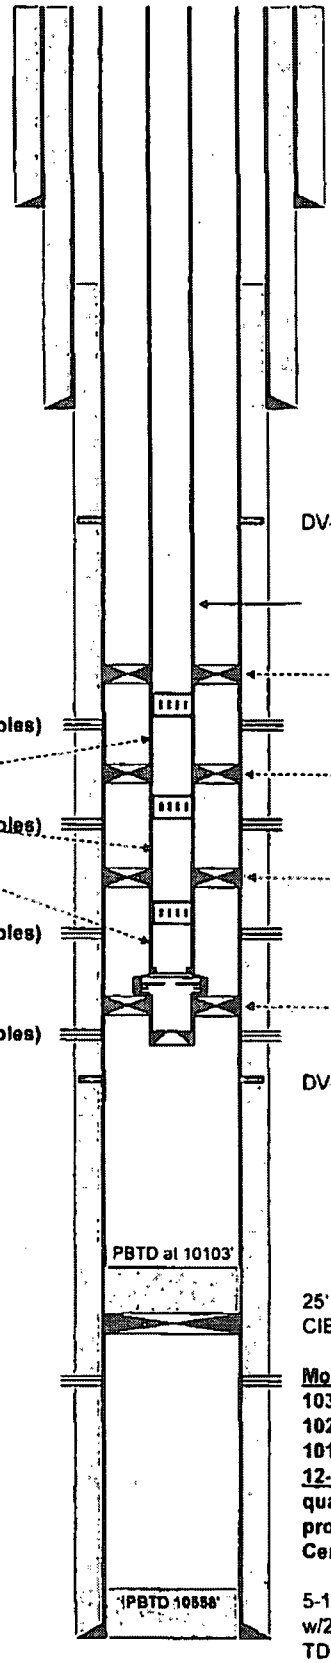

13-3/8", 48#, H-40 at 500'
w/600sx-TOC-Surf-Circ

TOC at 2164' (CBL-12/16/2002)

9-5/8", 47#, P-110 at 3010'
w/1100sx-TOC-Surf-Circ

NM OIL CONSERVATION
ARTESIA DISTRICT
APR 27 2015
RECEIVED

DV-Tool at 5504'

2-7/8" L-80 6.5# EUE 8rd tubing

Mechanical Compression (w/o slips) Packer at 7734'
Sliding sleeve 2.25" at 7767'

7776'-7818' (168 holes)

Hydraulic Packer without slips at 7828'
Sliding sleeve 2.25" at 7849'

2-7/8" L-80 6.5# EUE 8rd tubing

7842'-7862' (80 holes)

Wolfcamp perforations

Hydraulic Packer without slips at 7869'
Sliding sleeve 2.25" at 7884'

7880'-7896' (64 holes)

On-Off with 2.25" "F" nipple
Mechanical Packer with slips at 7902'
Hydro Trip Pressure Sub at 7911'

7908'-7932' (96 holes)

DV-Tool at 8076'

PBTD at 10103'

25' of cement above
CIBP at 10128'

Morrow Perforations
10397', 394, 367, 365, 10294', 288, 10282-276, 10263'-257, 10191, 10189, 10187, 10184, 10181, 10178'. (1 spf) TOTAL 46 HOLES
12-20-2002: Acidized and frac down casing w/65 quality 40# linear binary pad (375 Bbls) 38 bpm propped w/126,800 lbs Interprop & 32,200 lbs Cerabax Prop (20/40)

PBTD 10558'

5-1/2", 17#, L-80 at 10600'
w/2450sx-TOC at 2164' (CBL)
TD 10600' (11/19/2002)
