WELLBORE SCHEMATIC

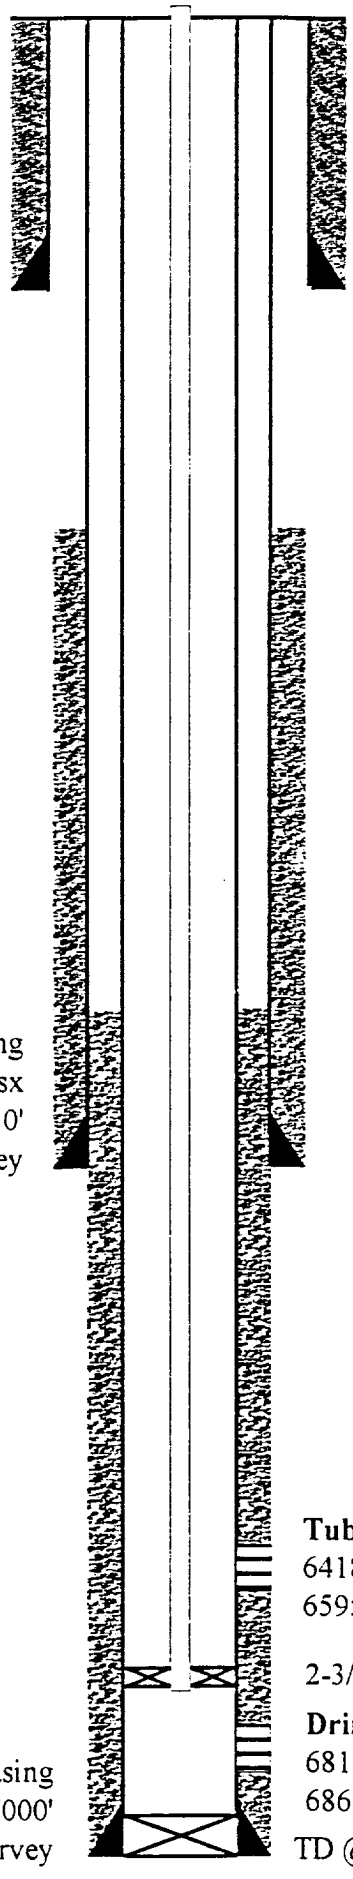

J. H. Williams No. 2

470' FSL & 990' FEL
Sec. 34, T-19S, R-37E, Lea County, NM
API: 30-025-34163
Spudded: 10/26/97
Completed:

KB: 3579' GL: 3569'

9-5/8" 36# Surface Casing
Cmt to /Surf. w/ 660 sx
Shoe @ 1241'

7" 23# Casing
Cmt to /Surf. w/ 250 sx
Shoe @ 4030'
TOC @ 2862' by Temp. Survey

Tubb Perforations
6418'-21', 6479'-82', 6508'-31',
6595'-99', 6607'-10', 6614'-17' (2 spf)

2-3/8" tbg w/Pkr @ 6750'

Drinkard Perforations
6812'-22, 6825'-29', 6845'-62',
6868'-82', 6895'-6904' (2 spf)

4-1/2" 15.5# Production Casing
Cement 265 sx, Shoe @ 7000'
TOC @ 2840' by Temp. Survey

TD @ 7000' PBTD @ 6980'

DLK 02-03-98
