# MERIDIAN OIL

FIELD: WINCHESTER
LEASE: STATE 32 COM WELL NO. 1
LOCATION: 660' FNL & 1,980' FEL; SEC. 32, T-19-S, R-28-E
EDDY COUNTY, NEW MEXICO

DATE SPUD: 10/02/79 COMP: 11/24/79
ELEVATION: 3,367' G.L. / 3,382' K.B.

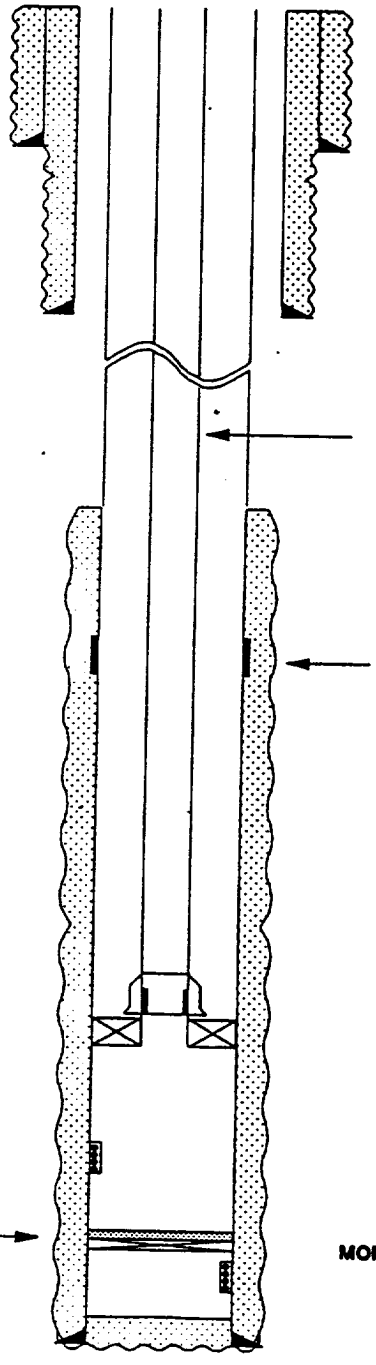

11 3/4", 42# @ 360'
H-40, ST&C
CEMENT W/ 375 sx "C"
TOC: SURFCE (CIRC 60 sx)

8 5/8", 24# @ 2,606'
K-55 & S-80, STC
CEMENT W/ 1,150 sx "C"
TOC: SURFACE (CIRC 20 sx)

TUBING STRING:
±306 JTS, (9,390') 2 3/8" N-80

TOC @ 5,210' (T.S.)

DV TOOL @ 7,120'

GUIBERSON TOOLS:
TYPE "XL" ON/OFF TOOL, 3.75" OD
W/ TYPE "R" PROFILE, 1.81" ID
GUIBERSON "UNI-VI" PACKER
SET @ ±9,390'

PROPOSED CISCO PERFORATIONS:
9,516-9,554'
STRIP GUN:
2 SPF (78 Holes)

CIBP @ ±10,570
CAP W/10 SX CEMENT

MORROW PERFORATIONS:
10,596-600', 10,618-622', 10,646-650'
10,716-722', 10,738-746', 10,783-788'
10,794-800', 10,830-836', 10,926-930'
2 JSPF, (90 Holes)

4 1/2", 11.6 & 13.5# @ 11,135'
N-80 & K-55; LTC, STC & BTC
1st Stage: 730 sx "H"
2nd Stage: 260 sx "H"
? sx Circ Off of DV Tool
TOC @ ± 5,210' (T.S.)

PROPOSED CONFIGURATION

TD: 11,136'
PBTD: 11,029'

LCP/ST32POST.DRW
04/25/94
