FIELD	OPERATOR	DATE
EUNICE MONUMENT - A	GULF	4/26/76

LEASE	WELL No.	LOCATION
Theodore Anderson	8	1980' FN & EL (G) Sec. 17 - T20S - R37E

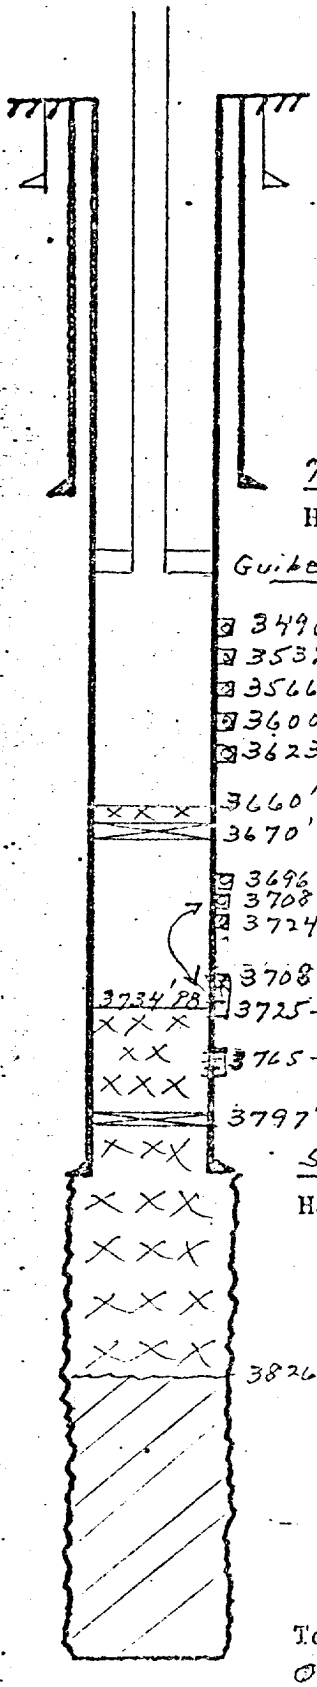

10 3/4"-32.75# casing set at 290' with 150 Sx Cement (w/300# Cacl)
Hole Size Est 13 1/4" to 300' (Plug @ 270') Calc TOC @ Circ

7 5/8"-26.40# casing set at 2409' with 375 sx of (w/700# Pozmix 2%) cement
Hole size 9 7/8" to 2425' (Plug @ 2379') Calc TOC @ 52'

Guiberson Pkr. @ 3457-3463' on 2 3/8" OD EUE Tbg.

3498-3500'
3532-3534'
3566-3568'
3600-3602'
3623-3625'
} Eun-Mon Perfs Open w/2-0.41" JHPF

3660'-PBTD
3670'-CIBP 2 Sx Cement

3696-3702'
3708-3718'
3724-3732'
} Eun-Mon Perfs Reperforated w/4-1/2" JHPF

3708-3718'
3725-3748'
} Eun-Mon Perfs Squeezed off below Retainer & Drilled out to 3734'

3734' PB

3765-3795' Eun-Mon Perfs Squeezed w/202 Sx. (4-1/2" JHPF

3797'-Cement Retainer Squeezed below w/124 Sx

5 1/2"-17# casing set at 3800' with 175 sx of C1 A cement
Hole size Est 6 3/4" to 3800' (Plug @ 3750') Calc TOC @ 1495'

3826' PBTD w/Hydromite

Total Depth 3868'
OH Size 4 3/4"
